



- Orientering om byggeriet. Campusrådsmøde Esbjerg. 26. feb. 2020

NYT SDU ESBJERG - Byggestartsevent 01.10.2019




Luftfoto med indtegnede nye SDU bygning. Der er mulighed for at se nærmere på byggepladsen fra lokalet i bygningen, eller ved at gå til punkterne 1. eller 2., hvorfra man kan få et indtryk af bygningen.

Nøglepunkter i tidsplanen

- Montage af betonelementer / Fitting of concrete panels
- Opmuring af facader / Construction of facades
- Ombygning i UCSYD-delen / Reconstruction of UCSYD section
- Aflevering til Bygningssstyrelsen / Handing over to the Danish Building and Property Agency
- Prøvedrift (ca. 6 weeks) / Operation test (approx. 6 weeks)
- Aflevering til SDU / Handing over to SDU

Sep.-Nov.2019
Oct.-Jan.2020
Dec.-Mar.2020
Sep.2020

Oct./Nov.2020

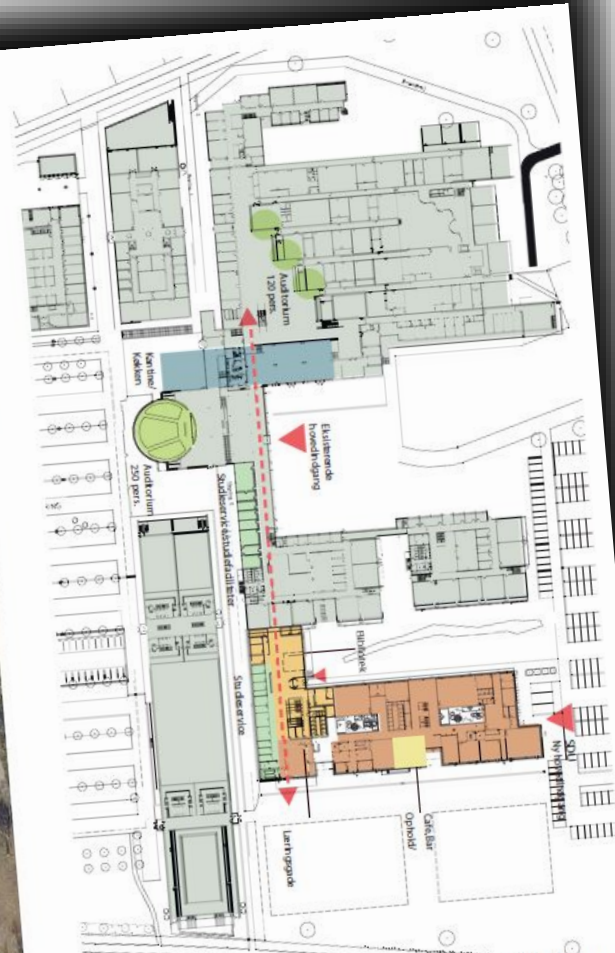

plantegning fra projektets start, der viser principperne for sammenhængen mellem SDU og UCSYD

Side 1

REGN, REGN, REGN!





- Merearbejdet og facadelukningen er godt i gang.
- Tagdækning har udfordringer i vejret.





- Hvor taget er færdigt arbejdes der med opsætning af installationer og gipsvægge.



- Stueplan Biblioteket med læringstrappen i baggrunden.



- 1. sal. Udtørring er i gang. Afventer tæt tag.



- Læringstrappen ved undervisning. Ovenlys monteret



- Orientering om byggeriet. Campusrådsmøde Esbjerg. 26. feb. 2020

- Løbende opdateringer fra byggepladsen via intranet.
- Overdragelse fra entreprenør til BYGST sep. / okt.
- Indflytning nov. / dec. (endelig dato fastsættes i juni)
- Arbejdsgrupper fortsætter arbejdet.

